



هيئة تطوير محمية
الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
Imam Abdulaziz Bin Mohammed Royal Reserve
Development Authority

مشروع تشجير 200 ألف شتلة في محمية الامام عبدالعزيز بن محمد الملكية

تقرير حالة المشروع

المحتويات

1. **نبذة عن المشروع**
نظرة عامة على مكونات المشروع وأهدافه ونطاق عمله.
04
2. **بيانات المشروع ونسب الإنجاز**
المعلومات الأساسية للمشروع، ومعدلات الإنجاز، وعدد العمالة والمعدات، والمدة الزمنية، والجوانب المالية وحركة الفواتير.
06
3. **ملخص إنجازات المشروع**
إضافة أهم إنجازات المشروع خلال فترة إعداد التقرير ووضع الصور التي تدعم تلك الإنجازات.
08
4. **إجراءات الصحة والسلامة المهنية**
إضافة أهم الإجراءات والأنشطة الاستباقية والإحترازية للصحة والسلامة المهنية في موقع العمل، وأهم الإنجازات، وآليات رفع مستوى السلامة الخاصة بالمشروع.
11
5. **صور من موقع العمل**
صور عامة عن المشروع لإبراز الوضع الحالي للمشروع.
13

نبذة عن المشروع

يهدف المشروع إلى تحقيق أحد مستهدفات الهيئة من زيادة الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة وتعزيز التنوع الإحيائي وذلك من خلال حفر وغرس 200.000 ألف (مئتين ألف) شتلة من الأشجار والشجيرات البرية في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية وتوريد الخزانات والمضخات والفلاتر اللازمة مع حماية ورعاية وصيانة الموقع طوال فترة المشروع 36 شهر من تاريخ إستلام الموقع.





بيانات المشروع ونسب الإنجاز

أسم المشروع

مشروع تشجير 200 ألف شتلة في محمية الامام عبدالعزيز بن محمد الملكية

مقاول المشروع

مدير المشروع

XYZ

123

رقم التواصل للمقاول

رقم العقد

XXXXXXXX

987654321

تاريخ نهاية المشروع:

تاريخ بداية المشروع:

2023-12-31

2023-01-01

365

163

202

SAR

7,070,791.46

SAR

5,364,777.56

15

2023-06-13

مدة المشروع

المدة المنقضية

المدة المتبقية


قيمة العقد

قيمة الفواتير المعتمدة


عدد الفواتير المعتمدة

تاريخ التحديث

نسب الإنجاز المخطط والفعلي

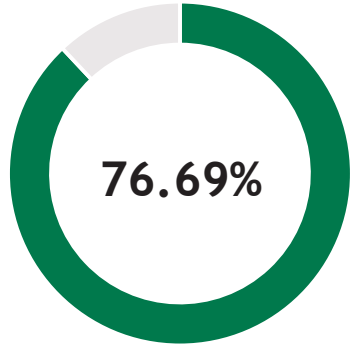

نسبة الإنجاز الفعلية

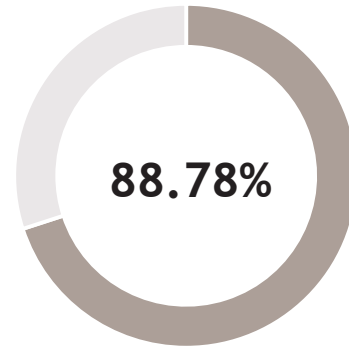

نسبة الإنجاز المخطط لها

● على المسار ● متأخر ● لم يبدأ بعد

أداء المشروع

أداء الجدول الزمني

(النسبة الفعلية / النسبة المخططة)

0.86

الإنحراف عن الجدول الزمني

(النسبة الفعلية - النسبة المخططة)

-12.09%

مشروع متأخر في الجدول الزمني

العمالة والمعدات

عدد المعدات

8

عدد المشرفين

2

عدد العمالة

30

بيانات المشروع ونسب الإنجاز (بيان تفصيلي حسب الجدول الزمني للمشروع)

نسبة الإنجاز التراكمية			نسبة الإنجاز الإيسبوعية			المرحلة الحالية للمشروع		
الإنحراف V	الفعلية EV	المخطط PV	الإنحراف V	الفعلية EV	المخطط PV	000000000000000000		
%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00			
#	بنود المشروع	حالة البند	بداية البند	نهاية البند	عدد أيام البند	النسبة المخططة	النسبة الفعلية	الإنحراف
1	A	لم يبدأ - جاري - مكتمل	2000-00-00	2000-00-00	00	%0.00	%0.00	%0.00
2	B							
3	C							
4	D							
5	F							
6	G							
7	H							
8	I							
9	J							
10	K							

ملخص منجزات المشروع

ملخص أعمال الفترة السابقة

الفترة من 2023-03-31 إلى

الفترة من 2023-03-01

ملخص الأعمال المنجزة

1. حفر وزراعة وري الشتلات بعدد 40000 شتلة في زون 4
2. توريد تربة زراعية بمقدار 1000 متر مكعب لأعمال زراعة الشتلات.
3. تأمين فريق عمل لرعاية الشتلات لمدة شهر.
4. تأمين المياه والري بكمية 4545 متر مكعب لمدة شهر.
5. تنفيذ 25 كيلو من السور صب خرسانة وتركيب جسور وشد وايرات حديد حول منطقة التشجير.
6. تأمين وتركيب عدد 1 مولد كهربائي خاص بتشغيل البركسات / بورتاكبن.
7. تركيب عدد 4 من اللوح التحذيرية حسب المواصفات المذكورة في نطاق العمل.

ملخص الأعمال المتوقع تنفيذه خلال الفترة القادمة

الفترة من 2023-04-07 إلى

الفترة من 2023-04-01

ملخص الأعمال المتوقعة للفترة القادمة

1. سيتم تأمين عدد 2 مكتب وسكن عمال البركاست
2. القيان بأعمال 100% من بناء مشتل مؤقت بأرض الموقع ومساحة مناسبة لكمية الشتلات في الموقع مع تجهيزها بجميع المعدات.
3. سيتم تزويد المكاتب بكل ما يلزم من دورات مياه ومواصفات السلامة والكهرباء والمياه ومكيفات والحفاظ على البيئة؟
4. سيتم البدء في زراعة 160000 شتلة وفقا للمخطط التفصيلي لموقع التشجير.

صور (نبذة عن مستوى السلامة الخاص بالمشروع)



صورة (المخالفات قبل / بعد)



إجراءات الصحة والسلامة المهنية

عدد الملاحظات المغلقة

52

ملاحظة

إجمالي عدد الملاحظات

58

ملاحظة

عدد الساعات التشغيلية بالمشروع

12350

ساعة عمل

ملخص الأعمال المنجزة

1. وضع اقماع السلامة في اماكن الحفر بمحيط الموقع ومناطق العمل
2. وضع شريط تحذيري بين الاقماع
3. وضع شريط تحذيري متكرر على الواير الحديد الواصل بين الجسور للتنبيه بوجود اعمال حفر
4. وضع شريط عاكس على كل الجسور للتنبيه
5. وضع لوحات تحذيرية في بدايات اماكن العمل في المعسكر او عند اماكن الحفر
6. تأمين طرق مستوية للمرور في بين مناطق التشجير وليس من خلالها
7. تأمين معدات الامن والسلامه الخاصه بالعمال (الخوذة - جواناتى حماية - نظارات - سيفتي شون)
8. استخدام معدات لمنع تساقط الزيوت بالموقع.

صور من موقع العمل



يجب ان يذكر تاريخ وموقع الصورة



يجب ان يذكر تاريخ وموقع الصورة



يجب ان يذكر تاريخ وموقع الصورة

صور من موقع العمل



يجب ان يذكر تاريخ وموقع الصورة



يجب ان يذكر تاريخ وموقع الصورة



يجب ان يذكر تاريخ وموقع الصورة

